


NIEUWE THERMISCHE ISOLATIE

Make-over in een zeer kort tijdbestek

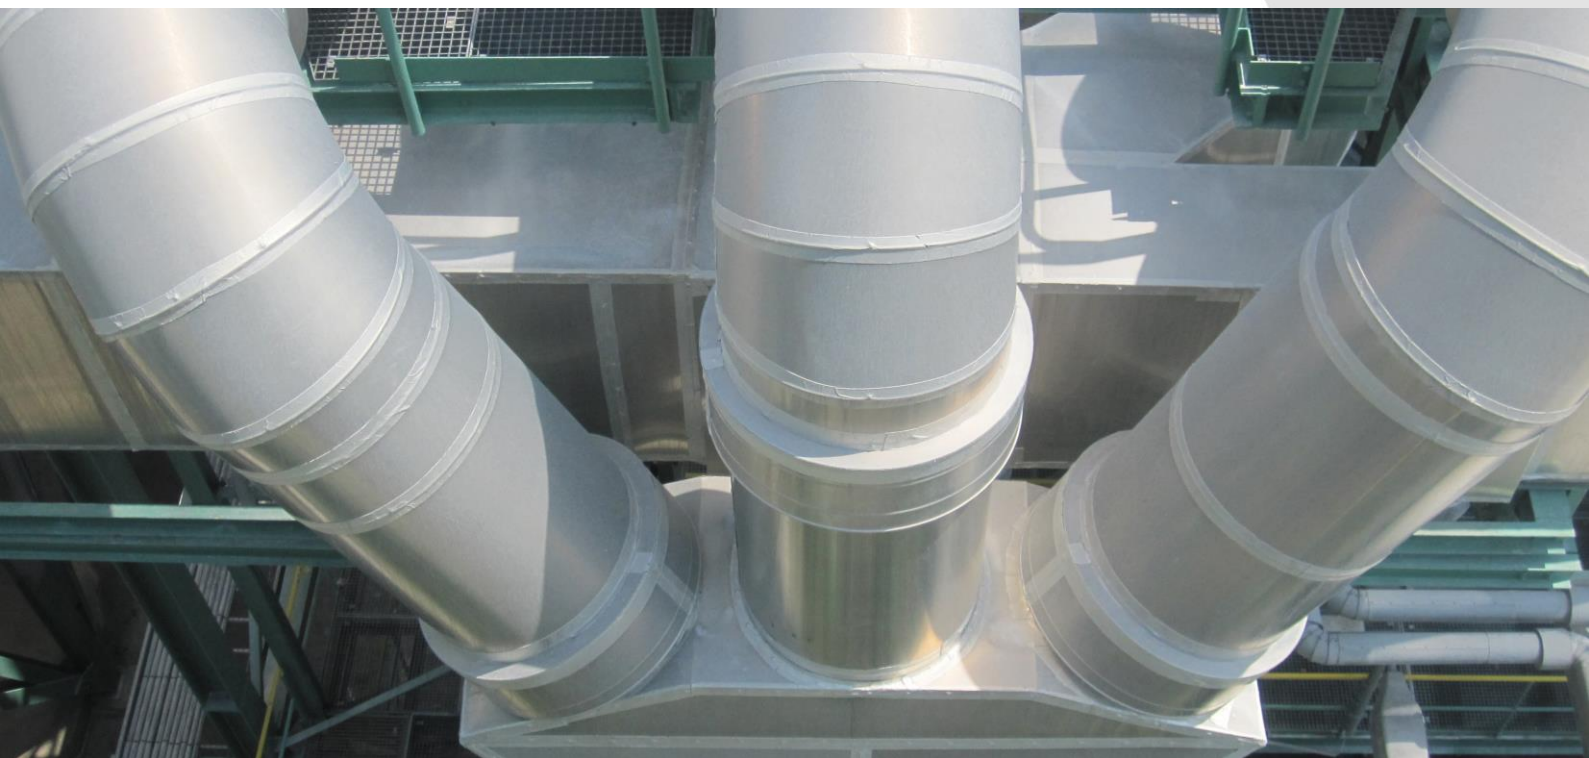

Door de inzet van vakmensen, grote flexibiliteit, snelle levertijden en korte communicatielijnen kan IC heel snel reageren op veranderende of onbekende situaties. Zoals in deze situatie waarbij reparatie-, schilder- en isolatiewerk gecombineerd uitgevoerd diende te worden. Bij dit project was de opleverdatum en de scope bekend maar bleef de startdatum voor IC enige tijd onbekend.

HET RESULTAAT

- Hoogwaardige isolatie
- Complete make-over binnen afgesproken tijdsbestek



ACHTERGROND

Herstelwerk aan en vervanging van isolaties in bestaande “oude” fabrieken vraagt een flexibele instelling en doordacht plan van aanpak. De werkelijke toestand van kanalen en apparaten is vaak pas zichtbaar na het verwijderen van de oude isolaties. Een deel van de engineering en plaatsing van de isolatiesystemen kan pas uitgevoerd worden na het noodzakelijke herstelwerk, echter de inbedrijfsteldatum staat wel vast.

DE UITDAGING

Het vervangen van ca. 1.400 m² isolaties met bijbehorende aluminium afwerking, uitgevoerd in vier fasen. Per fase was er een zeer korte doorlooptijd van maximaal 5 tot 6 werkdagen. Binnen dit tijdsbestek moest de de-montage, nieuwe isolatie, reparatie van kanalen en apparaten, als ook een meerlaagse coating worden uitgevoerd.



DE OPLOSSING

Een strakke en gedetailleerde werkvoorbereiding waarbij rekening is gehouden met meerdere scenario's. Met een efficiënte en flexibele inzet van 3.500 vakmannen op locatie en 1.100 prefab-uren in onze werkplaats. Dit onder constant veranderende omstandigheden en in goed overleg met andere contractors en de eindgebruiker.

CONTACT OUR SPECIALIST TEAM

+31 (0)251 22 96 50

icb@icbeverwijk.nl, www.icinsulation.com
